Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 1.OG Whg 2
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	05.12.25, 09:21
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 0 min
Startdruck	158 mbar
Enddruck	153 mbar
Druckabfall	5 mbar
Kommentar	Prüfung in Ordnung

Druckdiagramm

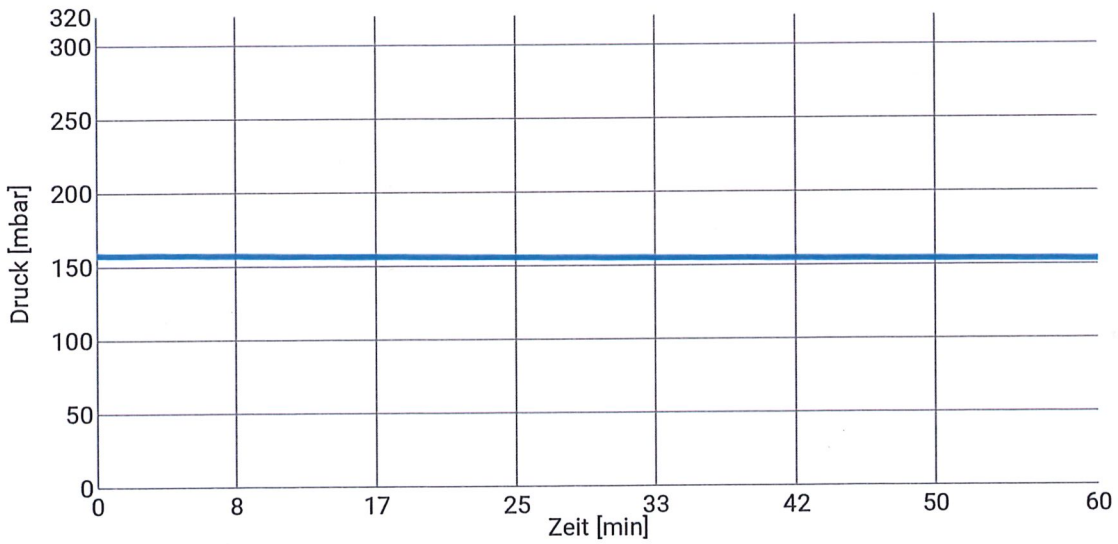

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
ZEHNDER
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 1.OG Whg 3
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	05.12.25, 11:36
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 1 min
Startdruck	149 mbar
Enddruck	144 mbar
Druckabfall	6 mbar
Kommentar	Prüfung in Ordnung

Druckdiagramm

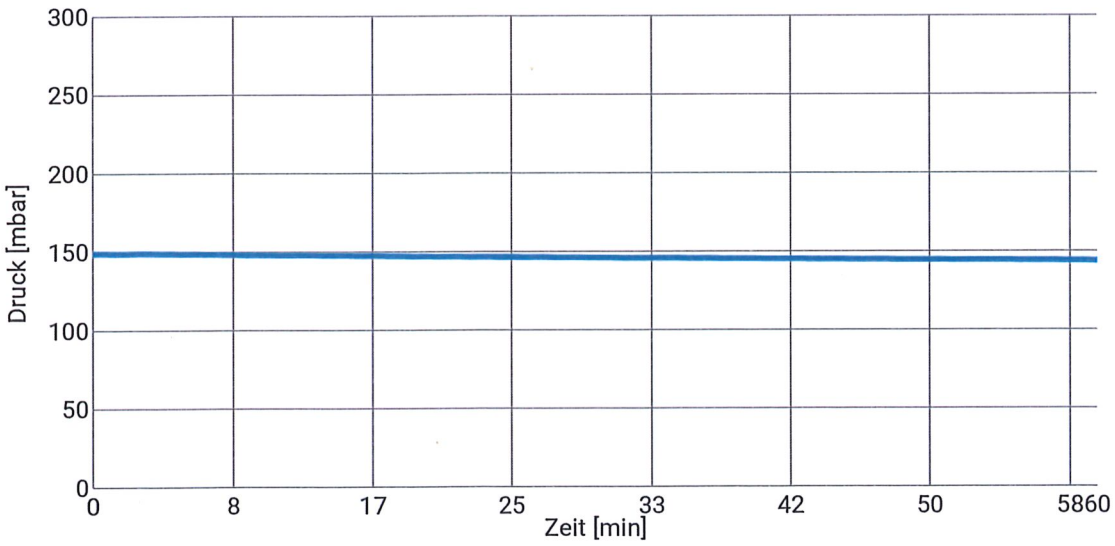

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
ZEHNDER
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 2.OG Whg 1
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	04.12.25, 11:15
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 26 min
Startdruck	156 mbar
Enddruck	148 mbar
Druckabfall	8 mbar
Kommentar	Prüfung in Ordnung

Druckdiagramm

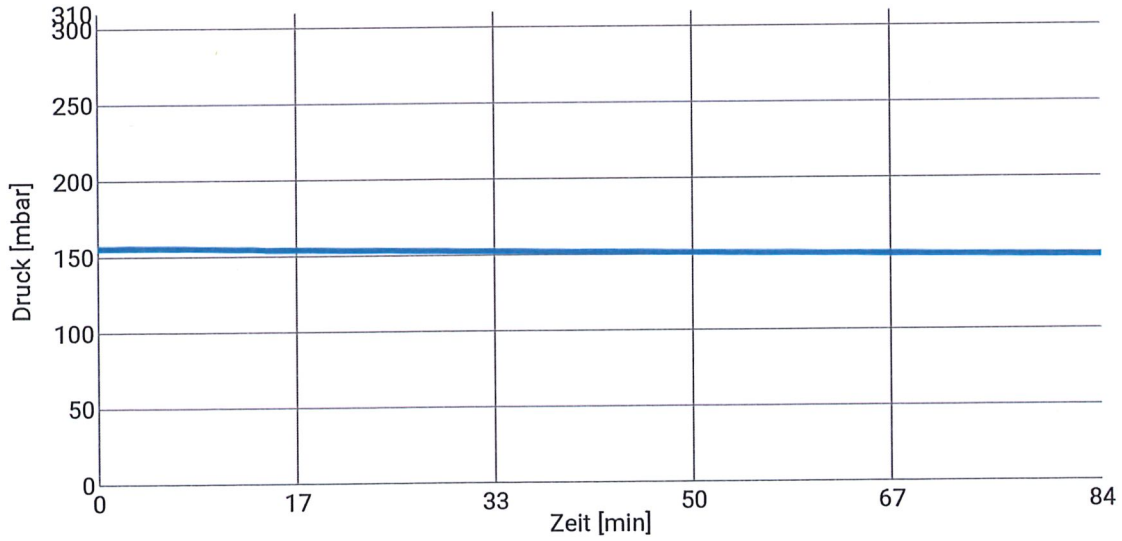

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
ZEHNDER
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 2.OG Whg 2
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	05.12.25, 13:12
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 23 min
Startdruck	155 mbar
Enddruck	146 mbar
Druckabfall	9 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

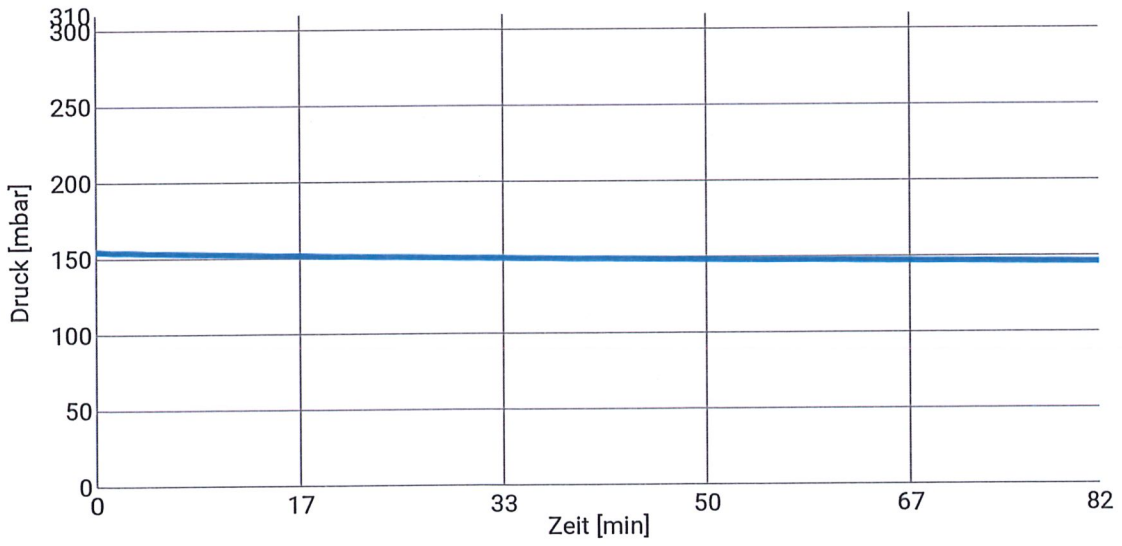

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch
ZEHNDER

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 2.OG Whg 3
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	09.12.25, 11:28
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	58 min
Startdruck	157 mbar
Enddruck	156 mbar
Druckabfall	1 mbar
Kommentar	Prüfung in Ordnung

Druckdiagramm

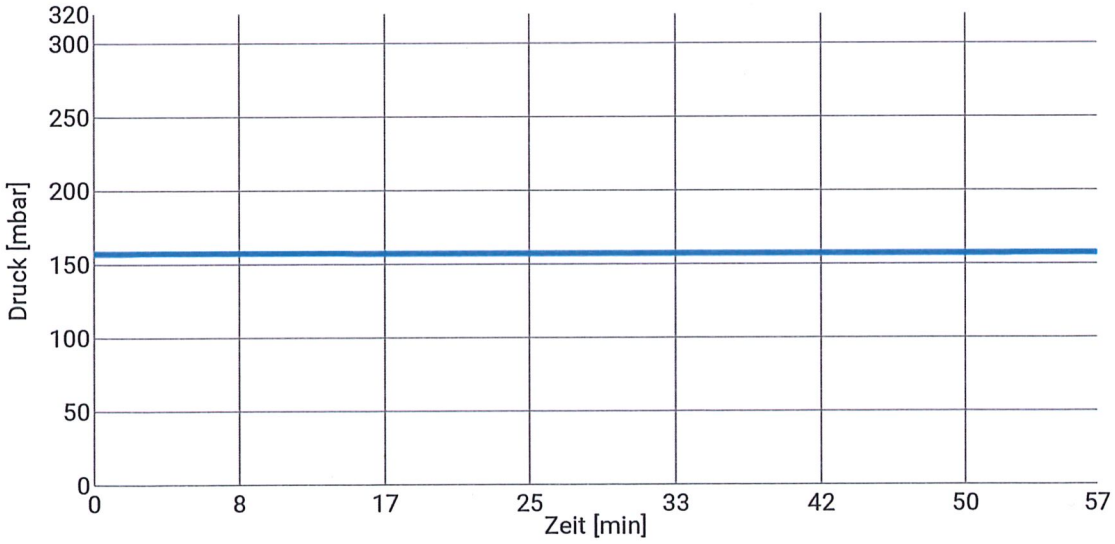

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 3.OG Whg 1
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	09.12.25, 13:19
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 36 min
Startdruck	148 mbar
Enddruck	142 mbar
Druckabfall	7 mbar
Kommentar	Prüfung in Ordnung

Druckdiagramm

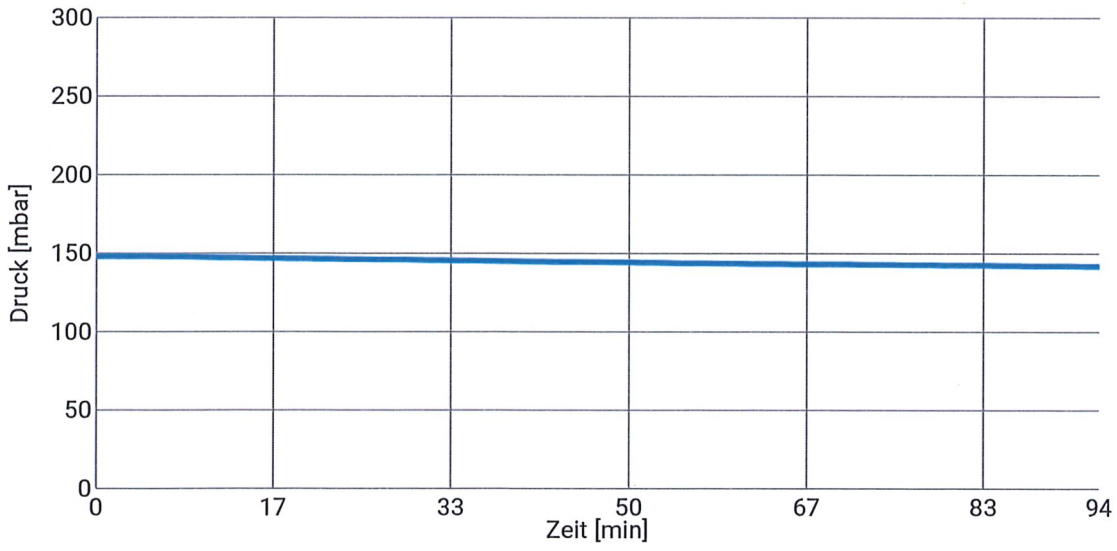

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch
ZEHNDER

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 3.OG Whg 2
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	09.12.25, 09:32
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 1 min
Startdruck	157 mbar
Enddruck	142 mbar
Druckabfall	15 mbar
Kommentar	Prüfung in Ordnung

Druckdiagramm

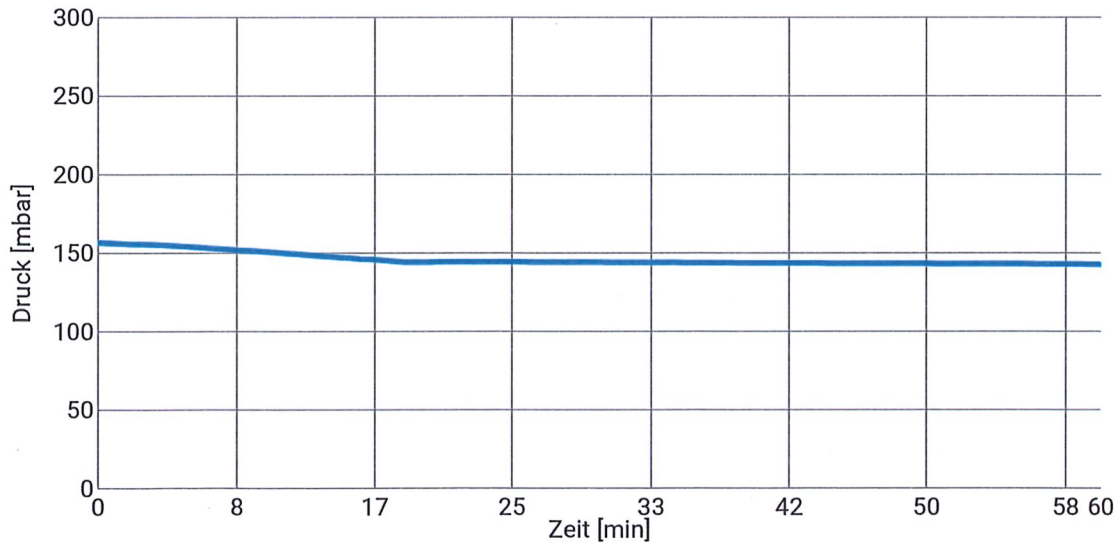

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
ZEHNDER
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 3.OG Whg 3
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	09.12.25, 15:46
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 12 min
Startdruck	144 mbar
Enddruck	135 mbar
Druckabfall	9 mbar
Kommentar	Prüfung in Ordnung

Druckdiagramm

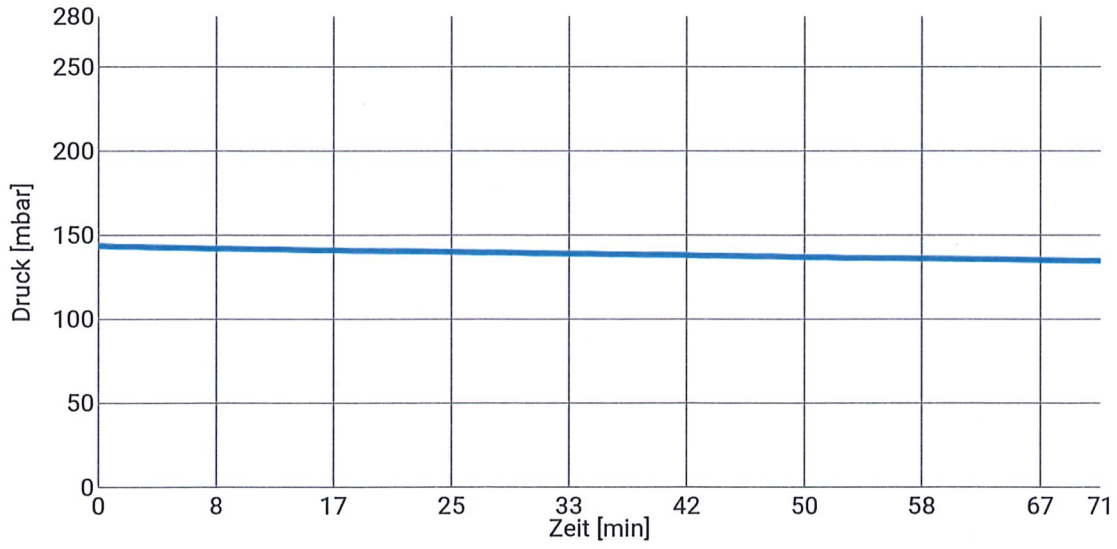

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Sanitär – Heizung
T 027 923 12 13
www.zehnder-haustechnik.ch

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A 1.OG Whg 1
Kunde	Irowe Consulting GmbH
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters


Prüfung

Gerät	Dräger PX4500 KSRA-0473
Sensor	-
Prüfmethode	Druckprüfung
Prüfzeit	04.12.25, 16:59
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	55 min
Startdruck	159 mbar
Enddruck	157 mbar
Druckabfall	2 mbar
Kommentar	Prüfung in Ordnung

Druckdiagramm

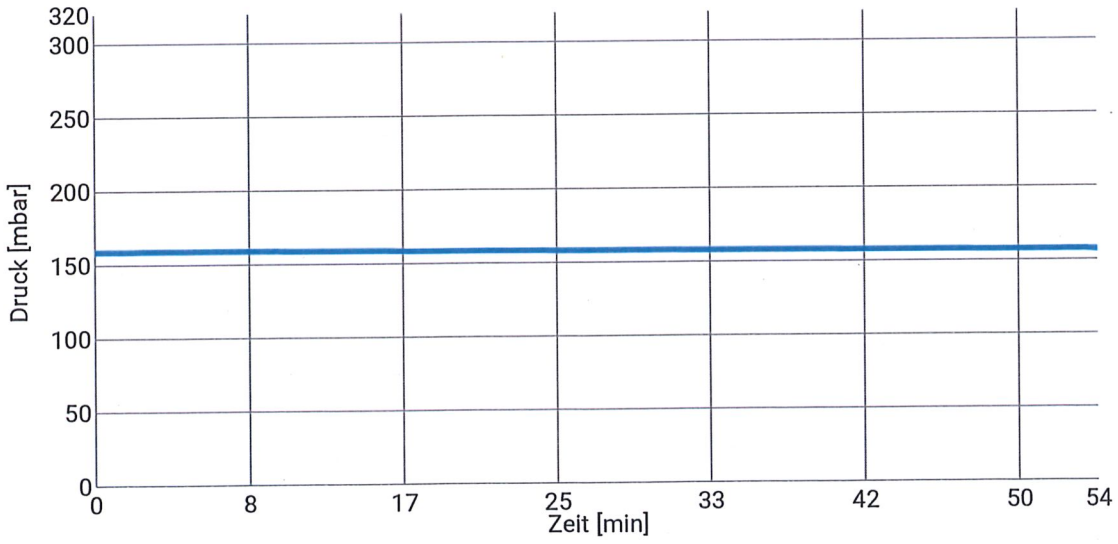

Prüfer		Auftraggeber	
Ort:		Ort:	
Datum:		Datum:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus A Att 1
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters



Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	09.12.2025 11:28
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	58 min
Startdruck	157 mbar
Enddruck	156 mbar
Druckabfall	1 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

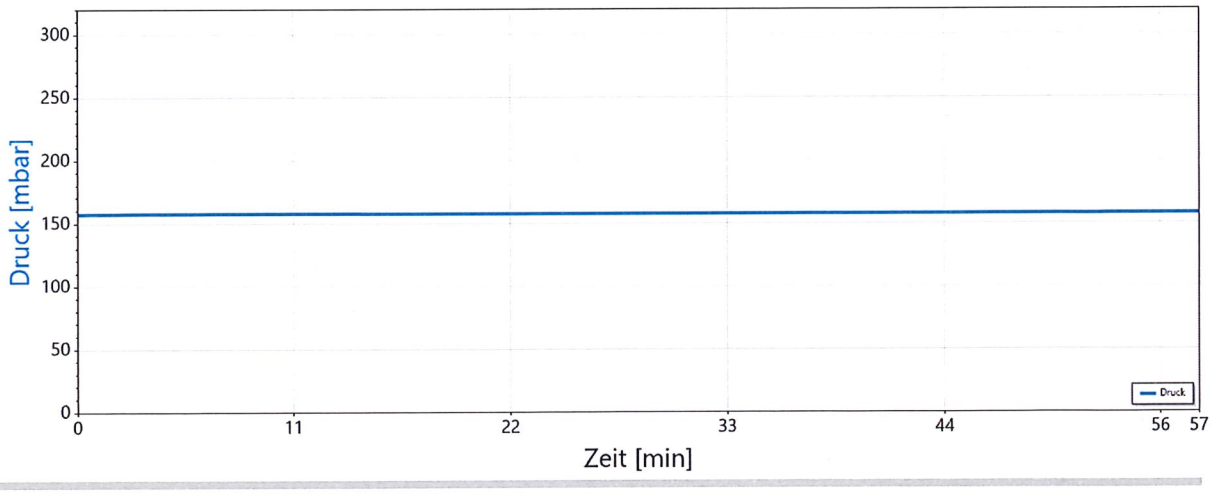

Prüfer		Auftraggeber	
Ort		Ort	
Datum		Datum	
Unterschrift		Unterschrift	

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 1.OG Whg 1
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	15.12.2025 16:16
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	57 min
Startdruck	152 mbar
Enddruck	140 mbar
Druckabfall	13 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

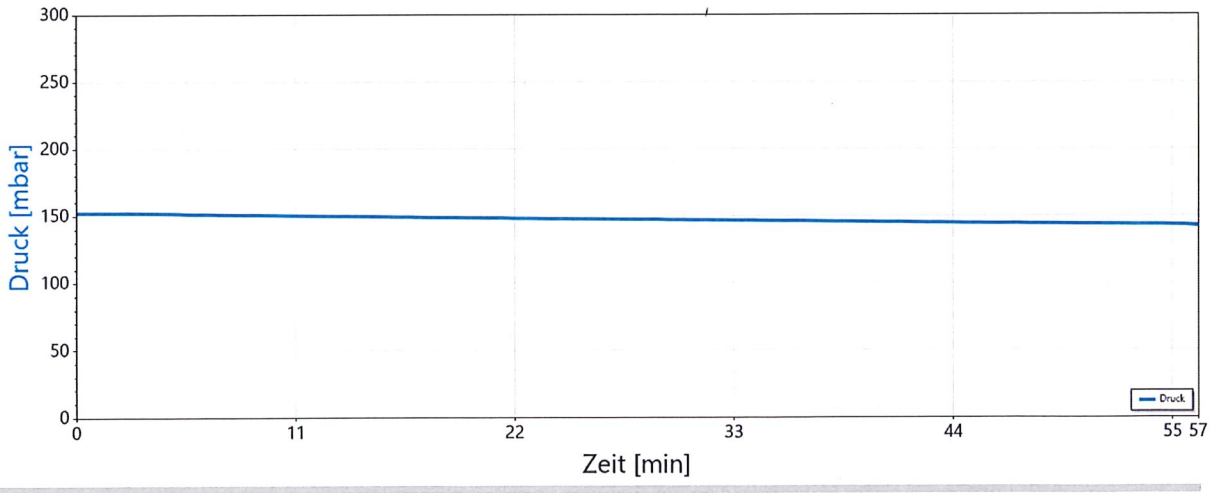

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 1. OG Whg 2
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters



Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	16.12.2025 09:25
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 8 min
Startdruck	146 mbar
Enddruck	142 mbar
Druckabfall	4 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

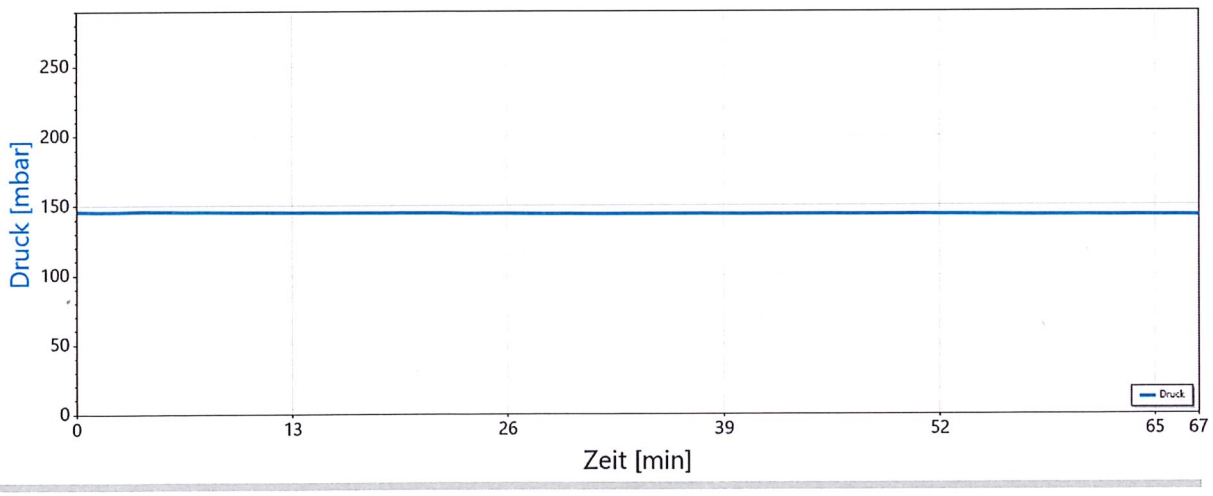

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 1.OG Whg 3
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	16.12.2025 10:45
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 7 min
Startdruck	150 mbar
Enddruck	139 mbar
Druckabfall	10 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

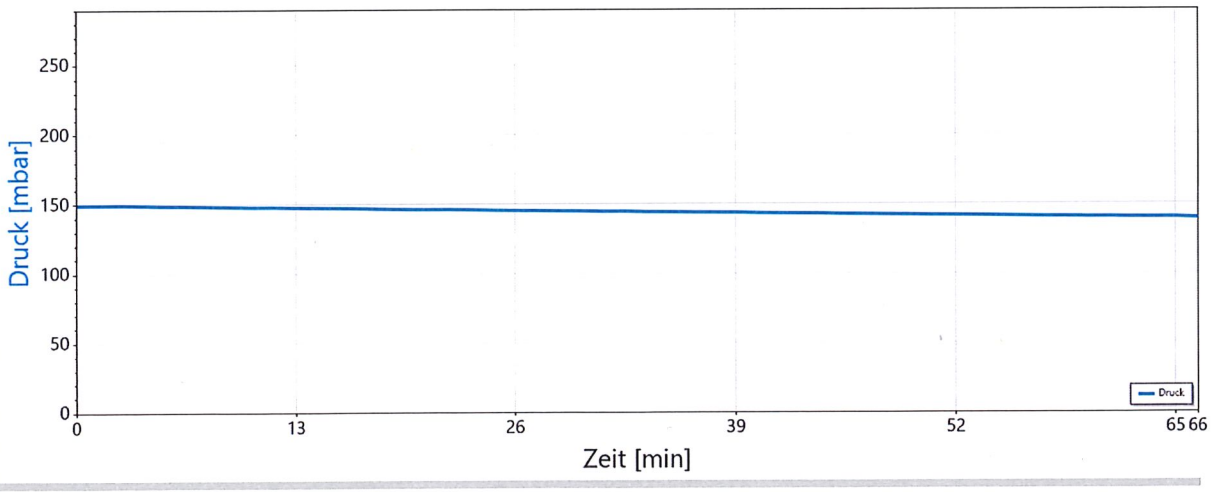

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 2.OG Whg 1
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters



Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	16.12.2025 13:34
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	2 h 33 min
Startdruck	154 mbar
Enddruck	137 mbar
Druckabfall	17 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

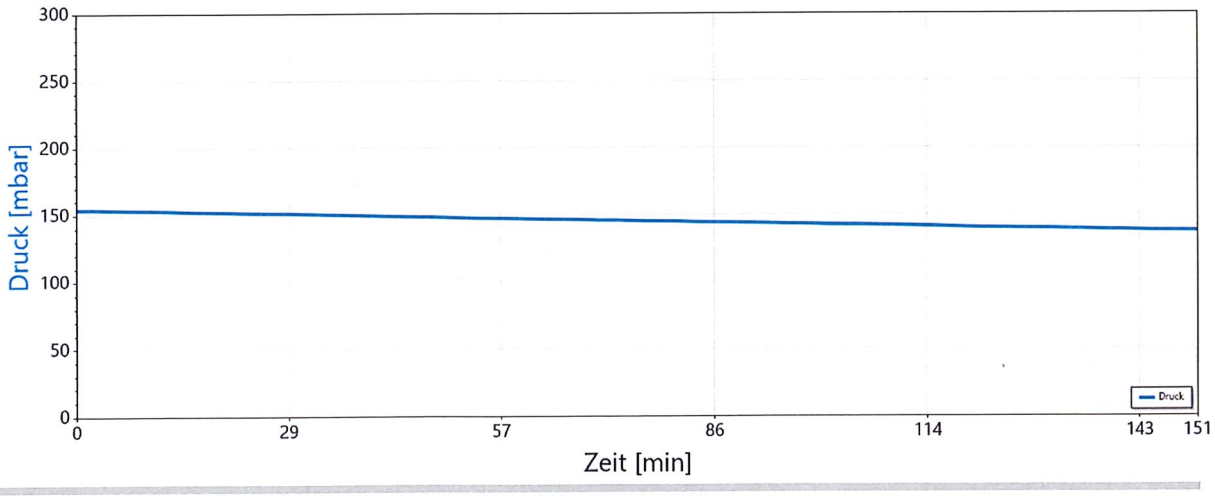

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 2.OG Whg 2
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters



Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	16.12.2025 16:42
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 36 min
Startdruck	141 mbar
Enddruck	136 mbar
Druckabfall	5 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

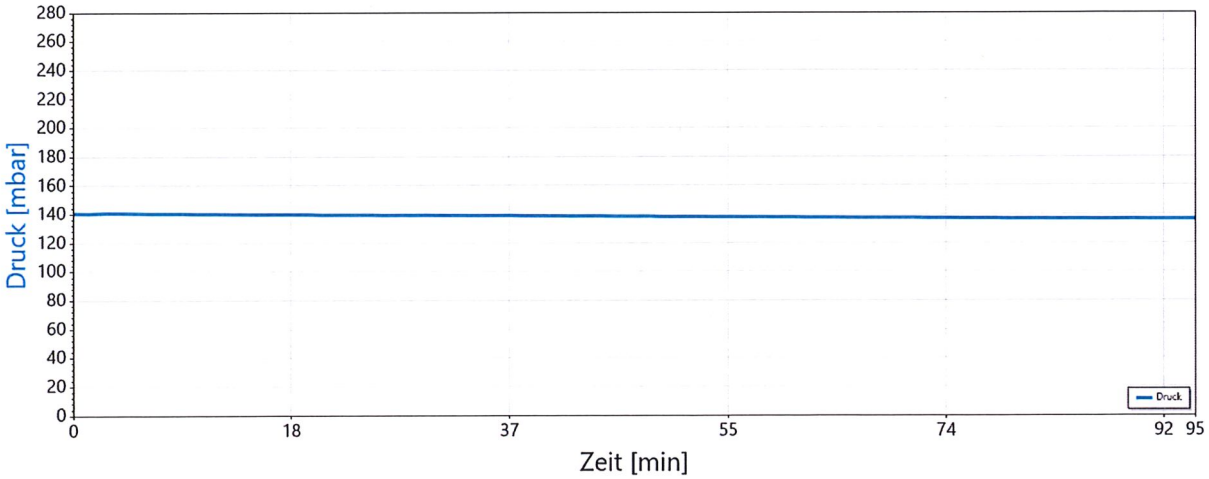

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 2.OG Whg 3
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters



Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	16.12.2025 14:33
Prüfer	Qelai Gezim

Prüfresultat

Prüfdauer	56 min
Startdruck	143 mbar
Enddruck	142 mbar
Druckabfall	2 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

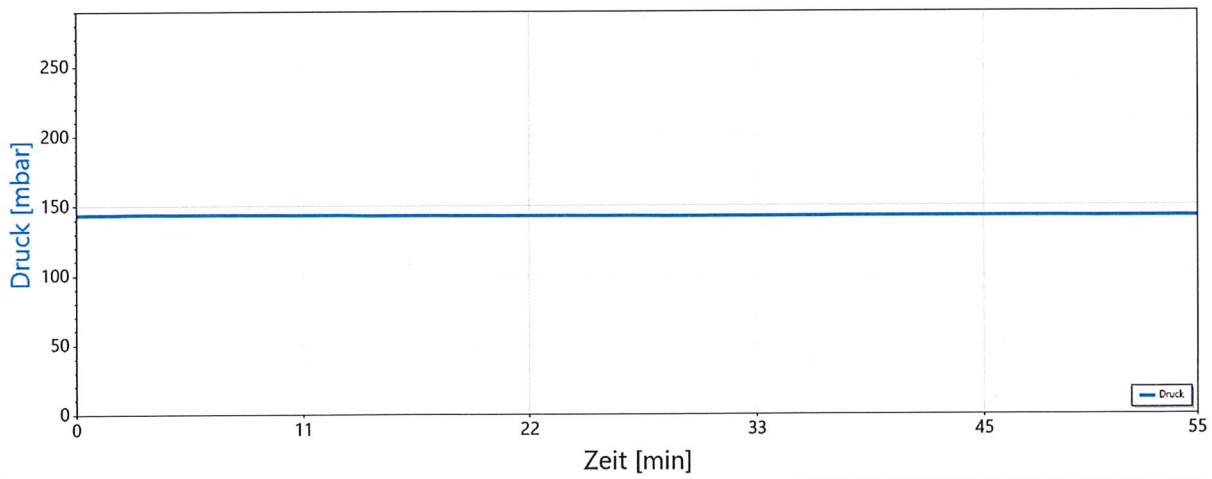

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 3 OG Whg 1
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters

Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	15.12.2025 14:39
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 2 min
Startdruck	153 mbar
Enddruck	149 mbar
Druckabfall	5 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

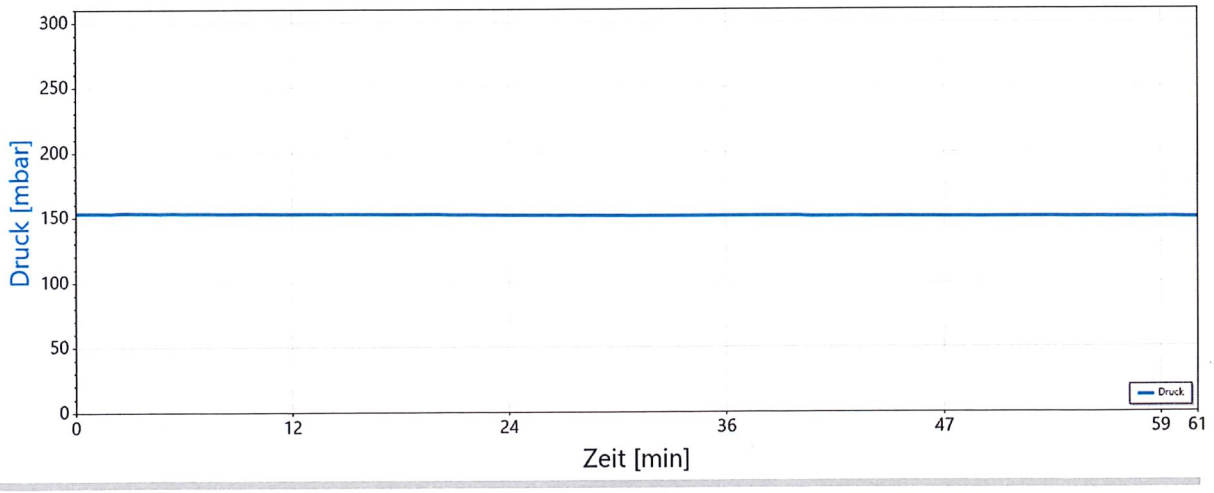

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 3. OG Whg 2
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters



Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	17.12.2025 13:50
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	2 h 1 min
Startdruck	150 mbar
Enddruck	147 mbar
Druckabfall	3 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

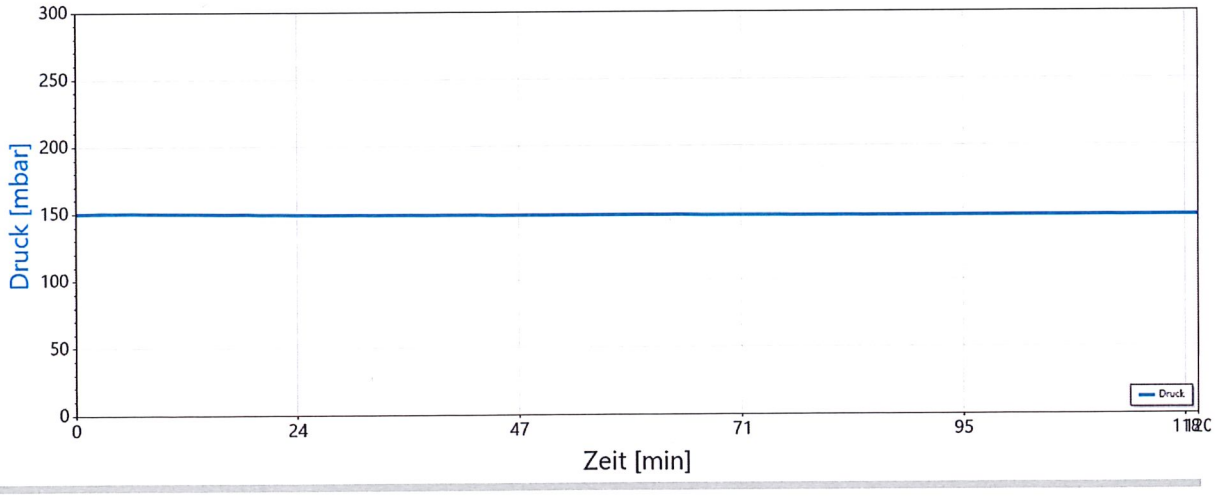

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B 3. OG Whg 3
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters



Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	17.12.2025 16:53
Prüfer	Woitec

Prüfresultat

Prüfdauer	58 min
Startdruck	154 mbar
Enddruck	148 mbar
Druckabfall	6 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

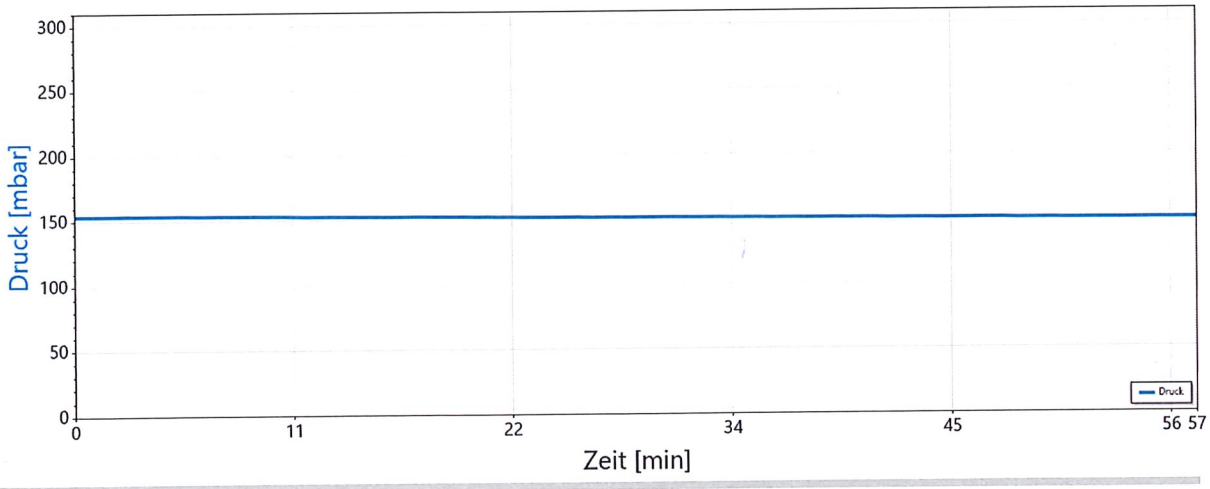

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____

Bericht Druckprüfung

Objekt

Objekt-Nr.	911.00
Objekt	Gamsgarten
Strasse und Hausnummer	Kantonsstrasse
Ort	3900 Brig-Gamsen
Prüfabschnitt	Haus B Att 1
Kunde	Irowe Consulting
Strasse und Hausnummer	Kehrstrasse 12
Ort	3904 Naters



Zehnder Josef AG
Helmut Mazotti
Fabrikstrasse 2
3900 Gamsen
Tel.: 027 923 12 13
helmut.mazotti@zehnder-haustechnik.ch


Prüfung

Gerät	PX4500 KSRA-0473
Sensor	Interner Sensor
Prüfverfahren	Druckprüfung
Prüfzeit	15.12.2025 14:39
Prüfer	Wojtek

Prüfresultat

Prüfdauer	1 h 2 min
Startdruck	153 mbar
Enddruck	149 mbar
Druckabfall	5 mbar
Kommentar	

Druckdiagramm

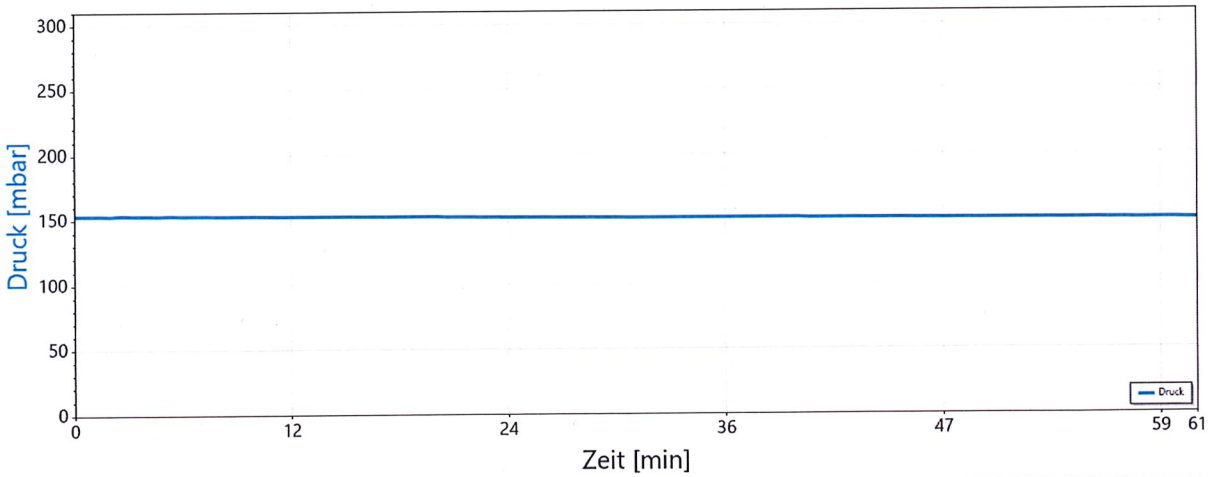

Prüfer		Auftraggeber	
Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
Unterschrift	_____	Unterschrift	_____
